



MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI DEL SUD ITALIA



AGOSTO 2015

Premessa al documento

Il presente documento espone lo stato degli investimenti effettuati sugli aeroporti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il documento è articolato nelle seguenti SEZIONI:

- **SEZIONE I:** riporta il totale dei **finanziamenti pubblici nel periodo 2000-2015** (comunitari, statali o regionali) per interventi infrastrutturali aeroportuali, con l'indicazione delle quote private di co-finanziamento a carico del gestore ove presenti; da tale quadro sono esclusi gli investimenti in totale autofinanziamento da parte del gestore in corso e riferiti a eventuali Contratti di Programma siglati con ENAC;
- **SEZIONE II:** dettaglia il dato totale della SEZIONE I ripartito per **singola opera**, con evidenziato **l'avanzamento percentuale**;
- **SEZIONE III:** riporta - per gli aeroporti considerati e dotati di un **Contratto di Programma** - un riepilogo degli investimenti (sia pubblici che privati) riferiti al periodo regolatorio, con il raffronto tra gli impegni economici assunti e quelli effettuati;
- **SEZIONE IV:** rappresenta – per gli aeroporti che hanno concluso o per i quali è ancora in corso l'affidamento in concessione parziale – il quadro degli investimenti spesi dai gestori aeroportuali per opere varie nel periodo di vigenza del regime concessorio ex art. 17 della legge 135/97.

La sintesi dei dati rappresentati nelle SEZIONI è la seguente.

AEROPORTI REGIONI ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA E SARDEGNA	
totale importi opere oggetto di finanziamenti pubblici 2000/2015 , comprensivi delle quote di co-finanziamento a carico del gestore e ad esclusione degli importi di opere totalmente in autofinanziamento riferibili a Contratti di Programma	1.036.982.269 €
Totale importi relativo ad opere totalmente autofinanziati dal gestore e riferiti a Contratti di Programma	215.392.862 €
totale importo introitato e reinvestito nel periodo di vigenza del regime concessorio ex art. 17 della legge 135/97	250.737.000 €
TOTALE AEROPORTI GESTITI DA PRIVATI	1.503.112.131 €
AEROPORTI A GESTIONE DIRETTA ENAC	
totale importi opere oggetto di finanziamenti pubblici 2000/2015 (Lampedusa e Pantelleria)	70.000.000 (*)

(*) di cui 53.000.000 € di finanziamento PON derivante dalle Premialità europee 2000/2006

SEZIONE I

Sintesi dei finanziamenti pubblici (comunitari, statali, regionali)

per opere aeroportuali nel periodo 2000-2015

(sono esclusi gli investimenti totalmente autofinanziati da parte del gestore

riferiti a Contratti di Programma siglati con ENAC)

REGIONE ABRUZZO

Aeroporto di PESCARA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	28.462.631
	Quota a carico del privato	115.000
	TOTALE €	28.577.631

REGIONE CALABRIA

Aeroporto di LAMEZIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	34.543.478
	Quota a carico del privato	897.147
	TOTALE €	35.440.625

Aeroporto di REGGIO CALABRIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	27.255.395
	Quota a carico del privato	180.106
	TOTALE €	27.435.502

Aeroporto di CROTONE

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	8.153.681
	Quota a carico del privato	0
	TOTALE €	8.153.681

RIEPILOGO REGIONE CALABRIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	69.952554
	Quota a carico del privato	1.077.254
	TOTALE €	71.029.808

REGIONE CAMPANIA

Aeroporto di NAPOLI

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	73.979.357
	Quota a carico del privato	1.553.117
	TOTALE €	75.532.474

Aeroporto di SALERNO

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	10.797.064
	Quota a carico del privato	0
	TOTALE €	10.797.064

RIEPILOGO REGIONE CAMPANIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	84.776.422
	Quota a carico del privato	1.553.117
	TOTALE €	86.329.539

REGIONE PUGLIA

Aeroporto di BARI

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	139.953.000
	Quota a carico del privato	31.071.000
	TOTALE €	171.024.000

Aeroporto di BRINDISI

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	77.534.000
	Quota a carico del privato	4.544.000
	TOTALE €	82.078.000

Aeroporto di TARANTO

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	125.649.000
	Quota a carico del privato	0
	TOTALE €	125.649.000

Aeroporto di FOGGIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	30.350.000
	Quota a carico del privato	1.000.000
	TOTALE €	31.350.000

RIEPILOGO REGIONE PUGLIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	373.486.000
	Quota a carico del privato	36.615.000
	TOTALE €	410.101.000

REGIONE SARDEGNA

Aeroporto di CAGLIARI

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	125.744.848
	Quota a carico del privato	13.693.749
	TOTALE €	139.438.597

Aeroporto di OLBIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	19.226.128
	Quota a carico del privato	5.204.008
	TOTALE €	24.440.136

Aeroporto di ALGHERO

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	33.209.838
	Quota a carico del privato	662.740
	TOTALE €	33.872.578

RIEPILOGO REGIONE SARDEGNA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015

Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	178.180.814
	Quota a carico del privato	19.570.497
	TOTALE €	197.751.311

REGIONE SICILIA

Aeroporto di PALERMO

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	78.848.377
	Quota a carico del privato	25.095.312
TOTALE €		103.943.689

Aeroporto di TRAPANI

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	16.290.209
	Quota a carico del privato	2.512.186
TOTALE €		18.802.395

Aeroporto di CATANIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	111.201.290
	Quota a carico del privato	9.263.039
TOTALE €		120.446.895

Aeroporto di LAMPEDUSA – gestione diretta ENAC

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 – 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici (*)	33.000.000
	Quota a carico ENAC	2.000.000
TOTALE €		35.000.000

Aeroporto di PANTELLERIA – gestione diretta ENAC

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 – 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici (*)	35.000.000
	Altri fondi	-
TOTALE €		35.000.000

(*) comprensivi del finanziamento PON derivante dalle Premialità europee 2000/2006

RIEPILOGO REGIONE SICILIA

Totale dei finanziamenti pubblici effettuati nel periodo 2000 - 2015		
Totale Investimenti realizzati	Fondi pubblici	206.339.876
	Quota a carico del privato	36.870.537
TOTALE €		243.192.979
AEROPORTI A GESTIONE DIRETTA - Fondi pubblici		70.000.000

SEZIONE II

Dettaglio investimenti per singola opera e stato avanzamento

REGIONE ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione e intervento	note
				€					
PESCARA	SAGA s.p.a	Lavori di adeguamento e messa a norma	€ 6.970.000,00	€ 5.000.000,00	M.I.T.	€ 0,00	NO	100%	
				€ 1.970.000,00	Delibera Regionale n. 783 del 11/08/2005				
		Aerostazione merci 1° lotto	€ 1.052.631,58	€ 1.000.000,00	Deliberazione CIPE n.20/04	€ 0,00	NO	100%	
				€ 52.631,58	Comune di Pescara				
		Tombamento fosso testata pista 04, acquisto terreni e fabbricati esistenti nella strip	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	Delibera Regionale n. 1089 del 12/12/2002	€ 0,00	NO	100%	
		Reparto Volo Polizia	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	Delibera Regionale n. 1030 del 21/11/2003	€ 0,00	NO	100%	
		Reparto Volo Guardia di Finanza	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	Delibera Regionale n. 1185 del 23/11/2005	€ 0,00	NO	100%	
		Ampliamento terminal	€ 3.460.000,00	€ 3.460.000,00	Delibera Regionale n. 1430 del 12/12/2006 Delibera Regionale n.443 del 10/08/2009	€ 115.000,00	NO	78%	In fase di gara pubblica per l'esecuzione lavori
		Impianto di trattamento acque di prima pioggia	€ 915.000,00	€ 800.000,00				7,2%	
		Ampliamento piazzale aeromobili	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00				100%	
		Riqualificazione aerea airside	€ 4.420.000,00	€ 4.420.000,00	PAR FAS 2007-2013	€ 0,00	NO	0,2%	In fase di gara pubblica per la progettazione esecutiva e esecuzione lavori
		Riqualificazione aerea landside	€ 3.960.000,00	€ 3.960.000,00	PAR FAS 2007-2013	€ 0,00	NO	1,5%	In fase di gara pubblica per la progettazione esecutiva e esecuzione lavori
Realizzazione di interventi in airside sulle aree di occupazione degli enti di stato	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	PAR FAS 2007-2013	€ 0,00	NO	0%	In fase di progettazione definitiva		
TOTALE AEROPORTO DI PESCARA			€ 28.577.631,58	€ 28.462.631,58		€ 115.000,00			

REGIONE CAMPANIA



REGIONE CAMPANIA STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione	note
NAPOLI CAPODICHINO	GESAC	Impianto HBS area smistamento 1	€ 3.570.000,00	€ 3.570.000,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione piazzale aviazione generale e relativi raccordi (lotto PON+lotto riutilizzi)	€ 3.384.000,00	€ 3.384.000,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione Nuova Recinzione aeroportuale	€ 2.354.822,00	€ 2.354.822,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Demolizione ex cargo building	€ 186.242,00	€ 186.242,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione nuovi check in e relativo sistema HBS	€ 6.055.750,00	€ 5.790.921,00	PON trasporti 2000-2006	€ 264.829,00	NO	100%	
		Realizzazione nuova cabina elettrica	€ 1.179.912,00	€ 1.179.912,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Ampliamento assi 30/35 e sopraelevazione assi 23/29 Terminal 1	€ 8.209.726,00	€ 8.209.726,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Nuova sala arrivi air side	€ 8.333.998,00	€ 7.889.763,00	PON trasporti 2000-2006	€ 444.235,00	NO	100%	
		Adeguamento regolamento aeroporti delle infrastrutture airside (Riqualificazione pista di volo, luci e taxiways)	6.165.581,00	€ 6.020.740,00	PON trasporti 2000-2006	€ 144.841,00	NO	100%	
		Realizzazione rete sottoservizi idraulici - fognari per pista raccordi piazzali	€ 10.401.000,00	€ 10.156.499,00	PON trasporti 2000-2006	€ 244.501,00	NO	100%	
		Ampliamento atrio partenze piano terra e primo del Terminal 1 (lotto PON+lotto riutilizzi)	10.300.000,00	€ 10.122.872,00	PON trasporti 2000-2006	€ 177.128,00	NO	100%	
		Costruzione parcheggi bus turistici in area ex A.M.I.	€ 4.699.395,00	€ 4.699.395,00	PON trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione Nuova bretella lato nord pista	€ 643.028,00	€ 643.028,00	PON trasporti 2000-2006 (Risorse liberate)	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione impianto di alimentazione e drenaggio acque etc. piazzali A1/A4 e E1/E5 (lotto riutilizzi)	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	PON trasporti 2000-2006 (Risorse liberate)	€ 0,00	NO	100%	
		Sopraelevazione area arrivi e sala imbarchi	€ 5.872.122,00	€ 5.594.539,00	PON trasporti 2000-2006 (Risorse liberate)	€ 277.583,00	NO	100%	
		Sopraelevazione nuova sala extra shengen - Assi 32-35	€ 2.786.898,00	€ 2.786.898,00	PON trasporti 2000-2006 (Risorse liberate)	€ 0,00	NO	100%	
		TOTALE AEROPORTO DI NAPOLI			€ 75.532.474,00	€ 73.979.357,00		€ 1.553.117,00	

SALERNO PONTECAGNANO	AEROPORTO COSTA D'AMALFI	Fornitura ed installazione dell'impianto vor/dme ndb presso l'aeroporto di Salerno Pontecagnano	€ 1.090.071,00	€ 1.090.071,00	Finanziato da Regione Campania Delib. G.R. 959/05	€ 0,00	NO	100%	
		Installazione sistema di radiogenazione dei bagagli, controlli di sicurezza dei passeggeri e del sistema di movimentazione bagagli	€ 730.113,38	€ 730.113,38	Finanziato da Legge 194/98 - Enac	€ 0,00	NO	100%	
		Lavori di segnaletica orizzontale, verticale luminosa ed impianto AVL, Impianto AVL	€ 2.258.720,92	€ 2.258.720,92	Finanziato da Regione Campania Delib. G.R. 959/05	€ 0,00	NO	100%	
		Attrezzature di base aerostazione e opere accessorie	€ 346.939,34	€ 346.939,34	Finanziato da Regione Campania Delib. G.R. 959/05	€ 0,00	NO	100%	
		Lavori di completamento Aeroporto Salerno SPA	€ 3.948.483,91	€ 3.948.483,91	Finanziato da Legge 194/98 - Enac	€ 0,00	NO	100%	
		Sistema Informativo	€ 1.372.736,39	€ 1.372.736,39	POR Campania 2000-2006	€ 0,00	NO	0%	
		Adeguamento strip	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	POR Campania 2000-2006	€ 0,00	NO	0%	
TOTALE AEROPORTO DI SALERNO			€ 10.797.064,94	€ 10.797.064,94		€ 0,00			
TOTALE AEROPORTI DELLA CAMPANIA			€ 86.329.538,94	€ 84.776.421,94		€ 1.553.117,00			

REGIONE PUGLIA



REGIONE PUGLIA STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione	note
BARI PALESE	AEROPORTI DI PUGLIA	Sistema controllo bagagli stiva (BA-07A)	€ 973.000,00	€ 973.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Adeguamento impianti di depurazione e smaltimento bottini di bordo (TR16)	€ 636.000,00	€ 636.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Riperimetrazione Aeroporto (TR14/BA-08A/BA08B/BA-12)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
			€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
			€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Smaltimento acque meteoriche (BA-09)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Impianto fotovoltaico (BA-04)	€ 2.000.000,00	€ 400.000,00	PON T 2000-2006	€ 1.600.000,00	NO	100%	
		Sistemazione a verde dell'APT (TR17)	€ 2.500.000,00	€ 954.000,00	Regione Puglia	€ 1.546.000,00	NO	100%	
		Realizzazione parcheggio multipiano	€ 10.000.000,00	€ 0,00		€ 10.000.000,00	NO	100%	
		Interventi di riqualifica della pavimentazione della pista di volo RWY 07/25 (BA-15)	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Ristrutturazione Caserma VVF (BA-13)	€ 1.589.000,00	€ 1.589.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Lavori di riqualificazione e inserimento di rotatoria al fine del miglioramento della sicurezza della viabilità aeroportuale (BA-16)	€ 520.000,00	€ 520.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	SI	100%	
		Prolungamento pista di volo (BA-05)	€ 7.694.000,00	€ 7.694.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Aumento dotazione parcheggi	€ 177.000,00	€ 0,00		€ 177.000,00	NO	100%	
		Ampliamento Piazzali di sosta degli aeromobili (BA-06)	€ 8.888.000,00	€ 8.888.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Ampliamento piazzali di sosta AA.MM e via di rullaggio (BA-03)	€ 9.516.000,00	€ 7.378.000,00	L. 135/97	€ 2.138.000,00	NO	100%	
Sistemi informativi (TR18)	€ 4.500.000,00	€ 2.316.000,00	PON T 2000-2006	€ 2.184.000,00	NO	100%			
Adeguamento infrastrutture di volo e prolungamento pista - adeguamento RESA (compresa acquisizione aree)	€ 12.400.000,00	€ 10.400.000,00	PON T 2007-2013	€ 2.000.000,00	NO	100%			
Potenziamento ed adeguamento degli A.V.L.	€ 4.000.000,00	€ 3.200.000,00	PON T 2007-2013	€ 800.000,00	NO	90%			
Raccordo "C" e "D" e riqualifica dei piazzali esistenti	€ 5.520.000,00	€ 5.520.000,00	PON T 2007-2013	€ 0,00	NO	60%			

		Ampliamento nuova aerostazione (TR-022)	€ 21.048.000,00	€ 16.838.000,00	PON T 2000-2006 - Regione Puglia	€ 4.210.000,00	NO	100%	
		Segnaletica luminosa verticale standard ICAO per area di manovra (BA-11)	€ 325.000,00	€ 325.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Nuova aerostazione e viabilità d'accesso (BA-1-2-4)	€ 54.347.000,00	€ 48.461.000,00	ENAC	€ 5.886.000,00	NO	100%	
		Riconversione spazi attuale aerostazione passeggeri	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Nuovo Centro Polifunzionale Aziendale	€ 1.330.000,00	€ 800.000,00	Regione Puglia	€ 530.000,00	NO	100%	
		Opere dovute all'incremento traffico aereo dell'aeroporto di Bari	€ 578.000,00	€ 578.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Piano Interventi Integrati miglioramento efficienza energetica	€ 12.032.000,00	€ 12.032.000,00	POIN Ambiente	€ 0,00	NO	100%	
TOTALE AEROPORTO DI BARI			€ 171.024.000,00	€ 139.953.000,00		€ 31.071.000,00			

BRINDISI	AEROPORTI DI PUGLIA	Sistema controllo 100% bagagli stiva (BR-03bis)	€ 1.609.000,00	€ 1.609.000,00	PON TI 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri (BR-02)	€ 13.166.000,00	€ 13.055.000,00	PON T 2000-2006	€ 111.000,00	NO	100%	
		Riconfigurazione viabilità e parcheggi operatori ed enti di stato (BR-07)	€ 1.898.000,00	€ 1.898.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Completamento ripristino ammaloramento piazzali di sosta aeromobili (BR-08)	€ 860.000,00	€ 677.000,00	PON T 2000-2006	€ 183.000,00	NO	100%	
		Adeguamento e potenziamento infrastrutture di volo e impianti alla normativa di riferimento (BR-05A/ BR-05B/BR-01D)	€ 20.836.000,00	€ 19.484.000,00	PON T 2000-2006	€ 1.352.000,00	NO	100%	
			€ 4.145.000,00	€ 4.145.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
			€ 166.000,00	€ 166.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione impianto fotovoltaico (BR-09)	€ 3.100.000,00	€ 620.000,00	PON T 2000-2006	€ 2.480.000,00	NO	100%	
		Sistemi informativi (TR-019)	€ 1.138.000,00	€ 720.000,00	PON T 2000-2006	€ 418.000,00	NO	100%	
		Realizzazione protezione perimetrale attiva e passiva (TR-012B)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Segnaletica luminosa verticale standard ICAO per aree di manovra (BR-06)	€ 895.000,00	€ 895.000,00	PON T 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Opere dovute all'incremento traffico aereo dell'Aeroporto di Brindisi	€ 865.000,00	€ 865.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Riconversione e ristrutturazione Terminal Aeroportuale	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	80%	in esecuzione, in esercizio dal 2016
		Riquilifica per l'adeguamento normativo della caserma VV.F. distaccamento aeroportuale	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	70%	in esecuzione, in esercizio dal 2016
		Rifacimento dei piazzali sosta aeromobili ed adeguamento delle infrastrutture di volo	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	50%	in esecuzione, in esercizio dal 2017
		TOTALE AEROPORTO DI BRINDISI			€ 82.078.000,00	€ 77.534.000,00		€ 4.544.000,00	

TARANTO	AEROPORTI DI PUGLIA	Piazzale sosta, taxiway e rullaggio	€ 104.661.000,00	€ 104.661.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	100%	
		Prolungamento pista di volo							
		Realizzazione strutture per Air Cargo							
		Adeguamento impianti aerostazione							
		Test range - Infrastrutturazione destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali	€ 20.988.000,00	€ 20.988.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	10%	in corso
TOTALE AEROPORTO DI TARANTO			€ 125.649.000,00	€ 125.649.000,00		€ 0,00			
FOGGIA	AEROPORTI DI PUGLIA	Adeguamento infrastrutture di volo ed impianti alla normativa di riferimento	€ 11.000.000,00	€ 10.000.000,00	Regione Puglia	€ 1.000.000,00	NO	100%	
		Prolungamento pista	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	NO	10%	
		Rete eliportuale pugliese (realizzazione e gestione)	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	SI	100%	
		Rete eliportuale pugliese (gestione)	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	Regione Puglia	€ 0,00	SI	25%	
TOTALE AEROPORTO DI FOGGIA			€ 31.350.000,00	€ 30.350.000,00		€ 1.000.000,00			
TOTALE AEROPORTI DELLA PUGLIA			€ 410.101.000,00	€ 373.486.000,00		€ 36.615.000,00			

REGIONE CALABRIA



REGIONE CALABRIA STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione	note
REGGIO CALABRIA	SOGAS	Impianti smistamento e controllo bagagli da stiva 100%- RC09A	€ 1.948.863,27	€ 1.948.863,27	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Prolungamento pista di volo 15-33, testata 33- RC04	€ 5.305.845,00	€ 5.305.845,00	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	98%	
		Ristrutturazione ed adeguamento aerostazione passeggeri I° e II° lotto - RC05-12	€ 10.900.000,00	€ 10.719.893,24	POR/FESR 2000/2006	€ 180.106,76	NO	1%	
		Adeguamento piazzale di sosta aeromobili e raccordi - RC09B	€ 252.807,60	€ 252.807,60	POR/FESR 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture air side 1° lotto piazzale aa.mm. e taxi way - RC10A	€ 916.260,67	€ 916.260,67	POR/FESR 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture air side 2° lotto RESA txt 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque- RC10B	€ 2.108.507,91	€ 2.108.507,91	POR/FESR 2000/2006	€ 0,00	NO	50%	
		Riqualifica pista di volo 15-33 - RC01	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Opere di potenziamento Airside II° lotto - RC02	€ 2.639.514,14	€ 2.639.514,14	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Edificio polifunzionale sosta mezzi rampa - RC11	€ 503.217,59	€ 503.217,59	PON/FESR 2000/2006	€ 0,00	NO	1%	
TOTALE AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA			€ 27.435.502,04	€ 27.255.395,28		€ 180.106,76			

LAMEZIA TERME	SACAL	Impianti smistamento e controllo bagagli da stiva 100% - CZ09	€ 4.988.209,28	€ 4.673.476,81	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 314.732,47	NO	100%	Intervento a scopo di sicurezza ultimato nel 2007 e collaudato nel 2009
		Riqualifica della pista di volo - CZ03	€ 4.046.583,83	€ 3.766.548,89	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 280.034,94	SI	100%	Intervento ultimato nel 2007 e collaudato nel 2008
		Riconfigurazione del piazzale di sosta aeromobili-CZ05A	€ 1.986.853,53	€ 1.896.406,08	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 90.447,45	SI	100%	Intervento ultimato e collaudato nel 2008
		Adeguamento impianti - CZ05B	€ 2.718.979,04	€ 2.507.046,28	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 211.932,76	NO	100%	Intervento a scopo di sicurezza ultimato nel 2008 e collaudato nel 2009
		Prolungamento pista di volo testata 28 ed opere complementari 1° lotto	€ 21.700.000,00	€ 21.700.000,00	CIPE + POR 2007-2013	€ 0,00	NO	100%	Intervento ultimato nel 2014 e collaudato nel 2015. Chiusura contabile da completare
TOTALE AEROPORTO DI LAMEZIA TERME			€ 35.440.625,68	€ 34.543.478,06		€ 897.147,62			
CROTONE	S. Anna Crotona	Impianti smistamento e controllo bagagli da stiva 100%	€ 199.452,74	€ 199.452,74	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Ampliam. e riqualifica del piazzale sosta aa.mm., raccordi, torri faro ecc.	€ 3.985.600,00	€ 3.985.600,00	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Impianto di trattamento acque meteoriche superficiali - sistemazioni idrauliche connesse agli interventi di adeguamento e messa a norma delle superficie di sicurezza Strip e RESA	€ 1.468.627,91	€ 1.468.627,91	PON TRASPORTI 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione ILS	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	POR Calabria FESR 2007/13	€ 0,00	NO	90%	
TOTALE AEROPORTO DI CROTONE			€ 8.153.680,65	€ 8.153.680,65		€ 0,00			
TOTALE AEROPORTI DELLA CALABRIA			€ 71.029.808,37	€ 69.952.553,99		€ 1.077.254,38			

REGIONE SICILIA



REGIONE SICILIA STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione	note
PALERMO PUNTA RAISI	GESAP	Indagini Geologiche	€ 1.501.137,83	€ 1.460.868,84	PON Trasporti 2000/2006	€ 40.268,99	NO	100%	
		Adeg. Aerostazione passeggeri - Opere civili	€ 10.747.179,45	€ 8.966.448,24	PON Trasporti 2000/2006 e Risorse L. 135/97 (Delibera CIPE 29/08/97)	€ 1.780.731,21	NO	100%	
		Adeg. Aerostazione passeggeri - Pontili telescopici	€ 4.038.570,72	€ 3.788.316,92	PON Trasporti 2000/2006 e Risorse L. 135/97 (Delibera CIPE 29/08/97)	€ 250.253,80	NO	100%	
		Adeg. Aerostazione passeggeri - Impianto restituzione bagagli	€ 2.026.360,91	€ 1.818.069,07	PON Trasporti 2000/2006 e Risorse L. 135/97 (Delibera CIPE 29/08/97)	€ 208.291,84	NO	100%	
		Impianto di controllo per la sicurezza bagagli da stiva - Apparecchiature EDS	€ 1.628.223,09	€ 1.628.223,09	PON Trasporti 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Impianto di controllo per la sicurezza bagagli da stiva - Completamento Apparecchiature	€ 3.473.661,56	€ 3.473.661,56	PON Trasporti 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Impianto di controllo per la sicurezza bagagli da stiva - Infrastrutture	€ 3.297.340,08	€ 3.018.362,61	PON Trasporti 2000/2006	€ 278.977,47	NO	100%	
		Reti idriche e fognarie - Adeguamento centrali tecnologiche	€ 8.874.631,70	€ 7.049.473,47	PON Trasporti 2000/2006 (Risorse Liberate)	€ 1.825.158,23	NO	94%	
		Adegum. infrastrutture air side 1° lotto. Lotto - Bonifica fasce di sicurezza	€ 5.791.881,79	€ 4.513.613,48	Delibera CIPE 142/1999	€ 1.278.268,31	NO	100%	
		Adegum. infrastrutture air side 2° lotto. Ampliamento piazzale aeromobili	€ 18.872.209,30	€ 16.542.094,86	PON Reti e Mobilità 2007/2013	€ 2.330.114,44	NO	100%	
		Adegum. infrastrutture air side 2° lotto. Integrazione area pavim. Lato Palermo	€ 8.745.338,42	€ 4.242.862,95	PON Reti e Mobilità 2007/2013	€ 4.502.475,47	NO	0%	Intervento in fase di aggiudicazione e importo lavori soggetto a ribasso d'asta
		Realizzazione Edificio servizi	€ 10.736.436,10	€ 1.061.833,53	Delibera CIPE 142/1999	€ 9.674.602,57	NO	99%	
		Nuova viabilità di accesso e distribuzione aeroportuale	€ 5.267.745,67	€ 4.778.898,87	Delibera CIPE 142/1999	€ 488.846,80	NO	100%	
		Terza sala check-in	€ 1.975.426,43	€ 1.483.891,24	Delibera CIPE 3/2006	€ 491.535,19	NO	58%	
		Potenziamento capacità impianto bagagli	€ 4.222.920,25	€ 3.976.862,76	Delibera CIPE 3/2006	€ 246.057,49	NO	84%	
Nuova Hall arrivi e aree collegate	€ 12.744.625,46	€ 11.044.895,51	Delibera CIPE 3/2006	€ 1.699.729,95	NO	67%			
TOTALE AEROPORTO DI PALERMO			€ 103.943.688,76	€ 78.848.377,00		€ 25.095.311,76			

CATANIA FONTANAROSSA	SAC	Ampliamento aerostazione	€ 84.290.000,00	€ 80.570.000,00	Legge 135/97	€ 3.720.000,00	NO	100%	
		Realizzazione via di rullaggio e bretelle-testata 08	€ 7.230.000,00	€ 7.230.000,00	Ex art. 17	€ 0,00	NO	100%	
		Realizzazione via di rullaggio e bretelle-testata 26	€ 9.900.000,00	€ 8.853.089,98	QCS PON	€ 1.064.343,23	NO	100%	
		Ampliamento piazzali aeromobili	€ 7.750.000,00	€ 5.770.000,00	QCS PON/art.17	€ 1.980.000,00	NO	100%	
		Sistema controllo bagagli 100% da stiva AA/MM in partenza	€ 8.700.000,00	€ 7.895.915,34	CIPE 142/99	€ 804.084,66	NO	100%	
		Nuovo sistema controllo antintrusione perimetrale	€ 2.576.895,16	€ 882.284,50	CIPE 142/99	€ 1.694.610,66	NO	100%	
TOTALE AEROPORTO DI CATANIA			€ 120.446.895,16	€ 111.201.289,82		€ 9.263.038,55			
TRAPANI BIRGI	AIRGEST	Ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri, degli edifici operativi e degli impianti	€ 8.960.289,13	€ 7.762.583,94	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04 Risorse Liberate	€ 1.197.705,19	NO	100%	
		Trasferimento deposito carburante JA1	€ 2.263.301,57	€ 1.784.062,97	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04	€ 479.238,60	NO	100%	
		Edifici ricovero mezzi di rampa	€ 398.693,33	€ 315.881,04	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04 Risorse Liberate	€ 82.812,29	NO	100%	
		Ristrutturazione area merci	€ 640.764,28	€ 567.215,96	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04 Risorse Liberate	€ 73.548,32	NO	100%	
		Adeguamento delle infrastrutture di volo alla normativa "ICAO"	€ 5.724.910,07	€ 5.232.086,05	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04 Risorse Liberate	€ 492.824,02	NO	100%	
		Impianto controllo bagagli da stiva 100% ed opere complementari	€ 814.437,06	€ 628.379,07	POR Sicilia 2000-2006 Misura POR 6.04	€ 186.057,99	NO	100%	
TOTALE AEROPORTO DI TRAPANI			€ 18.802.395,44	€ 16.290.209,03		€ 2.512.186,41			
TOTALE AEROPORTI DELLA SICILIA			€ 243.192.979,36	€ 206.339.875,85		€ 36.870.536,72			

REGIONE SARDEGNA



REGIONE SARDEGNA STATO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON STRUMENTI NAZIONALI E/O COMUNITARI PERIODO 2000-2015

Aeroporto	Società di Gestione	Descrizione Intervento	Importo totale Intervento	Quota finanziamento pubblico (IT/UE)		Quota finanziamento privato	Intervento inerente l'accessibilità	% realizzazione	note
OLBIA COSTA SMERALDA	GEASAR	Sistema controllo 100% bagagli da stiva-ENAC OL 01	€ 2.147.000,00	€ 2.147.000,00	PON Trasporti 2000/2006	€ 0,00	NO	100%	
		Opere di completamento aerostazione passeggeri ENAC OL	€ 768.096,95	€ 583.722,79	CIPE 17/2003	€ 184.374,16	NO	100%	
		Ampliamento del piazzale di sosta aereomobili e relative strutture logistiche 1° lotto dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda - ENAC OL 03	€ 9.084.751,11	€ 7.267.800,89	CIPE 17/2003	€ 1.816.950,22	NO	100%	
		Ampliamento piazzale di sosta aereomobili e relative strutture logistiche - Il Lotto, nuovo terminal aviazione generale - ENAC OL 04	€ 12.440.288,00	€ 9.227.604,00	PON Trasporti 2000/2006	€ 3.212.684,00	NO	100%	
TOTALE AEROPORTO DI OLBIA			€ 24.440.136,06	€ 19.226.127,68		€ 5.214.008,38			
CAGLIARI ELMAS	SOGAER	Ammodernamento e ristrutturazione funzionale dell'aeroporto di Cagliari Elmas	€ 82.142.152,23	€ 82.142.152,23	PON Trasporti	€ 0,00	SI	100%	Entrata in servizio il 26 giugno 2003
		Sistema controllo 100% bagagli da stiva	€ 446.444,34	€ 432.695,43	PON Trasporti	€ 13.748,91	NO	100%	Entrata in servizio nel gennaio 2003
		Riqualificazione aereopuerto Classe "ICAO" (Pista Principale) Riqualificazione e ristrutturazione della pista 14-32 (Principale) e adeguamento impianti AVL	€ 23.000.000,00	€ 18.400.000,00	PON Trasporti	€ 4.600.000,00	NO	100%	Entrata in servizio il 9 aprile 2009
		Zona di sicurezza "RESA" testata 32 pista principale mediante colmata stagno - Adeguamento pista di volo sussidiaria comprese aree di sicurezza di testata (RESA) e tombamento canale di guardia	€ 7.000.000,00	€ 5.600.000,00	CIPE 17/2003	€ 1.400.000,00	NO	100%	Entrata in servizio il 19 dicembre 2007
		Ristrutturazione aerostazione aviazione generale	€ 1.200.000,00	€ 1.020.000,00	PON Trasporti	€ 180.000,00	NO	100%	Entrata in servizio il 28 luglio 2011
		Implementazione sistemi di sicurezza alla normativa europea	€ 900.000,00	€ 900.000,00	PON Trasporti	€ 0,00	NO	100%	Completata nel giugno 2009
		Ristrutturazione delle infrastrutture CC ed EI per polo merci e intermodalità	€ 14.250.000,00	€ 4.250.000,00 € 5.000.000,00	PON Trasporti CIPE 62/2011	€ 5.000.000,00	SI	80%	La parte da completare è in attesa dell'approvazione del Master Plan
		Ampliamento piazzale aereomobili e modifica viabilità aeroportuale	€ 10.500.000,00	€ 8.000.000,00	PON Trasporti	€ 2.500.000,00	NO	0%	In attesa approvazione Master Plan
TOTALE AEROPORTO DI CAGLIARI			€ 139.438.596,57	€ 125.744.847,66		€ 13.693.748,91			

ALGHERO FERTILIA	SOGEAAL	Sistema controllo 100% bagagli da stiva	€ 284.782,99	€ 284.782,99	APQ Mobilità	€ 0,00	NO	100%	
		Riqualifica via di rullaggio 1° lotto	€ 3.607.346,38	€ 3.607.346,38	PON Trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Riqualifica piazzale sosta aeromobili	€ 6.570.823,28	€ 6.570.823,28	PON Trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Riqualifica pista di volo	€ 6.009.903,67	€ 6.009.903,67	PON Trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Completamento riqualifica via di rullaggio	€ 6.401.685,82	€ 6.401.685,82	PON Trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
		Ristrutturazione vecchia aereostazione	€ 5.662.739,86	€ 5.000.000,00	PON Trasporti 2000-2006	€ 662.739,86	NO	67%	
		Sistema di controllo perimetrale e completamenti operativi	€ 5.335.296,28	€ 5.335.296,28	PON Trasporti 2000-2006	€ 0,00	NO	100%	
TOTALE AEROPORTO DI ALGHERO			€ 33.872.578,28	€ 33.209.838,42		€ 662.739,86			
TOTALE AEROPORTI DELLA SARDEGNA			€ 197.751.310,91	€ 178.180.813,76		€ 19.570.497,15			

SEZIONE III

Contratti di Programma

riepilogo degli investimenti (sia pubblici che privati) riferiti al periodo regolatorio

REGIONE CAMPANIA

Aeroporto di Napoli Capodichino

Il Contratto di Programma ENAC - GESAC quadriennio 2009 - 2012 è entrato in vigore il 26 novembre 2009.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2009 -2012		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	41.496.000
	Autofinanziati	90.583.000
	TOTALE €	132.079.000
Investimenti realizzati (*)	Fondi pubblici	43.805.000
	Autofinanziati	93.625.000
	TOTALE €	137.430.000

(*) Per l'aeroporto di Napoli, nella rendicontazione degli interventi realizzati si è tenuto conto anche di investimenti riferiti alle annualità 2013 e 2014 per un importo totale di € 22.476.000 di cui € 22.464.000 di investimenti privati.

Intermodalità: E' in fase di realizzazione la Stazione metropolitana "Capodichino" che collegherà nei prossimi anni il Terminal Aeroportuale alla Linea 1 della metropolitana di Napoli.

REGIONE PUGLIA (**)

Aeroporto di Bari Palese (*)

Il Contratto di Programma ENAC - AdP (aeroporto di Bari) quadriennio 2009 - 2012 è entrato in vigore il 14 giugno 2010, con più di 15 mesi di ritardo.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2009 -2012		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	69.390.000
	Autofinanziati	33.661.513
	TOTALE €	103.051.513
Investimenti realizzati	Fondi pubblici	34.535.993
	Autofinanziati	9.884.684
	TOTALE €	44.420.677

Intermodalità: L'aeroporto è collegato con la linea ferroviaria

(*) Alcune opere previste sono risultate al momento non attuabili.

() Per gli aeroporti della Puglia, nelle annualità 2013, 2014 e 2015 sono state realizzate opere ulteriori per un importo totale di € 66.571.814**

Aeroporto di Brindisi (*)

Il Contratto di Programma ENAC - AdP (aeroporto di Brindisi) quadriennio 2009 - 2012 è entrato in vigore il 13 maggio 2010, con più di 14 mesi di ritardo.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2009 -2012		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	116.820.000
	Autofinanziati	4.250.000
	TOTALE	121.070.000
Investimenti realizzati	Fondi pubblici	24.785.665
	Autofinanziati	1.222.378
	TOTALE	26.008.043

(*) Alcune opere previste sono risultate al momento non attuabili.

() Per gli aeroporti della Puglia, nelle annualità 2013, 2014 e 2015 sono state realizzate opere ulteriori per un importo totale di € 66.571.814**

REGIONE SICILIA

Aeroporto di Palermo Punta Raisi

Il Contratto di Programma Enac-Gesap 2011 - 2014 è entrato in vigore il 20.09.2012 con circa 19 mesi di ritardo.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011 -2014		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	70.332.817
	Autofinanziati	91.932.973
	TOTALE	162.265.790
Investimenti realizzati	Fondi pubblici	33.456.701
	Autofinanziati	51.219.212
	TOTALE	84.675.913

Intermodalità: L'aeroporto è collegato con la linea ferroviaria

Aeroporto di Catania Fontanarossa

Il Contratto di Programma ENAC - SAC quadriennio 2012 - 2015 è entrato in vigore il 13 marzo 2013 con circa 14 mesi di ritardo.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2012 -2015		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	-
	Autofinanziati	140.615.029
	TOTALE	140.615.029
Investimenti realizzati	Fondi pubblici	-
	Autofinanziati	55.923.588
	TOTALE	55.923.588


Intermodalità: Progetto per l'integrazione tra le modalità di trasporto aereo e ferroviario

ENAC, la SAC ed RFI sono stati i promotori dell'Azione che intende mettere a sistema le modalità di accesso su ferro allo scalo catanese, prevedendo un'integrazione effettiva nell'aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa, tra la linea ferroviaria nazionale Messina-Catania-Palermo e la linea metropolitana urbana in progetto. La Commissione Europea ha co-finanziato il progetto preliminare dell'intervento per 1 Mil di Euro.

L'attuazione di tali progetti favorirà non solo la connessione con l'area metropolitana di Catania ma anche con altre città della catchment area dello scalo, migliorando sensibilmente l'accessibilità dell'aeroporto che ha ormai ampiamente consolidato un ruolo fondamentale nel garantire la mobilità dei cittadini della regione.

Il progetto del nodo intermodale sviluppato, trasmesso da Enac al MIT con nota prot. 77320 del 28/06/2013, si compone di diversi interventi, il cui costo complessivo è stimato in circa 180 Mil €.

- **interramento di una parte del tracciato ferroviario** Bicocca – Catenanuova al fine di rendere compatibile l'operatività ferroviaria con quella aeroportuale
- nuova fermata "**stazione Aeroporto**" sulla rete RFI fra Catania Acquicella e Catania Bicocca, dedicata ad accogliere sia treni di media percorrenza delle direttrici Messina - Catania- Palermo e Messina-Catania-Siracusa, sia dei treni regionali Catania-Siracusa, con relativa aree dedicata al trasporto pubblico su gomma di interconnessione, e un collegamento tramite un **People mover** fra la fermata Stazione Aeroporto e il terminal passeggeri;
- **terminal intermodale di Bicocca**, che dovrà essere adeguato alle esigenze di rifunzionalizzazione dei flussi merci.

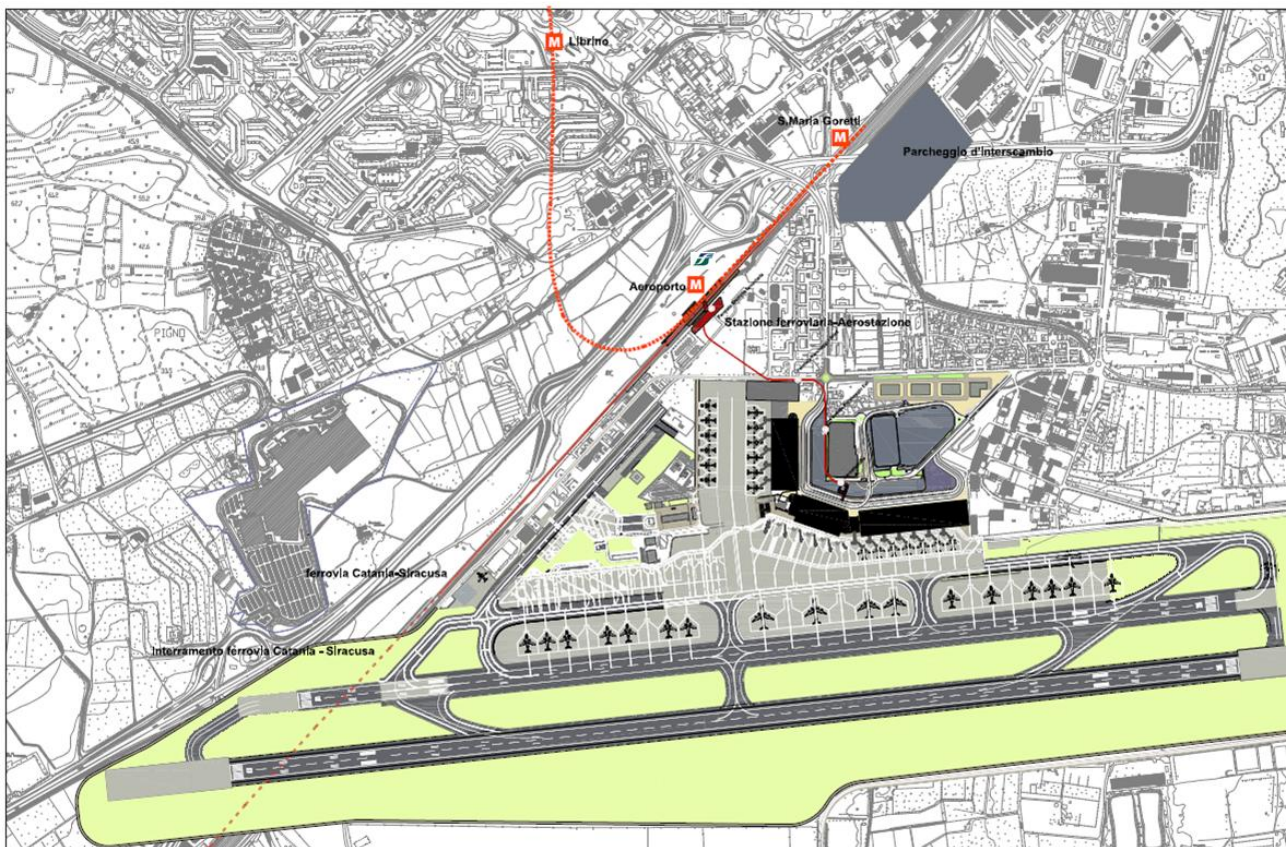

REGIONE SARDEGNA

Aeroporto di Cagliari Elmas

Il Contratto di Programma ENAC - SOGAER quadriennio 2012 - 2015 è entrato in vigore il 20 luglio 2014 con circa 30 mesi di ritardo.

Totale dei finanziamenti effettuati nel periodo di vigenza di CONTRATTO DI PROGRAMMA 2012 -2015		
Investimenti programmati	Fondi pubblici	9.935.000
	Autofinanziati	22.747.000
	TOTALE	32.682.000
Investimenti realizzati	Fondi pubblici	4.673.000
	Autofinanziati	3.518.000
	TOTALE	8.191.000

Intermodalità: E' stato realizzato il collegamento pedonale dell'aeroporto con la stazione FS e la riqualificazione del tratto ferroviario Cagliari-Decimomannu.

SEZIONE IV

Investimenti ex art. 17 della legge 135/97

Aeroporto	Importo introitato e reinvestito nel periodo di vigenza del regime concessorio ex art. 17 della legge 135/97
Pescara	10.980.000 €
Napoli Capodichino	22.295.000 €
Salerno Pontecagnano	651.000 €
Aeroporti di Puglia	19.740.000 €
Lamezia Terme	28.500.000 €
Reggio Calabria	19.500.000 €
Crotone	4.802.000 €
Palermo Punta Raisi	34.404.000 €
Catania Fontanarossa	37.265.000 €
Trapani Birgi	12.200.000 €
Cagliari Elmas	13.600.000 €
Olbia	24.800.000 €
Alghero Fertilia	22.000.000 €
TOTALE	215.392.862 €
